



Mijlpalenplanning PoC DUO

Stuurgroep PoC DUO

V1.0

20-6-2025

Toelichting op de mijlpalenplanning

De mijlpalenplanning geeft op hoofdlijnen inzicht in het traject bij positief besluit van het DTO. Het einddoel is het in gebruik hebben van de landelijke oplossing voor beeldbeschikbaarheid op 31 december 2026 (streefdatum) bij de gehele doelgroep. De doelgroep bestaat uit ongeveer 130 zorginstellingen (73 ziekenhuizen, 6 diagnostische centra, ongeveer 50 behandelklinieken en revalidatiecentra).

Met het uitvoeren van de activiteiten voor project PoC DUO hebben leveranciers Founda Health, Enovation en Alpatron Zorgverbinders ook inzicht gekregen in de impact van benodigde aanpassingen op hun dienstverlening voor beeldbeschikbaarheid. Zij hebben op basis van dit voortschrijdend inzicht streefdatums benoemd voor de vier belangrijkste mijlpalen:

1. **31 december 2025:** Enovation en Founda hebben DUO beschikbaar voor uitrol op de productomgeving van hun klanten en voor elke geïnteresseerde zorginstelling die nog niet over een XDS aansluiting beschikt.
2. **2 februari 2026:** Alpatron “TLB met Mitz” (zonder DUO) is op productie-omgeving beschikbaar voor elke geïnteresseerde zorginstelling, voor onderling uitwisselen van (radiologische) beeldonderzoeken tussen zorginstellingen met de Alpatron-oplossing.
3. **1 juni 2026:** Alle drie leveranciers hebben hun gebruikers voorzien van een oplossing met DUO voor de landelijke oplossing voor beeldbeschikbaarheid. Deze is beschikbaar voor huidige gebruikers, en voor elke nieuwe geïnteresseerde zorginstelling.
4. **31 december 2026:** einddoel “alle zorginstellingen zijn aangesloten op de landelijke oplossing voor beeldbeschikbaarheid”. Deze streefdatum is o.a. gebaseerd op de aanname dat elke zorginstelling tijdig voldoet aan drie belangrijke randvoorwaarden.

De implementatie-aanpak zal in het plan van aanpak nader worden uitgewerkt waarbij impact voor de zorginstellingen zoveel mogelijk wordt beperkt. Enovation en Founda hebben streefdatum DUO beschikbaar op 31 december 2025, Alpatron heeft streefdatum DUO beschikbaar op 1 juni 2026.

DUO heeft scope XCA-i koppeling obv NTA v1.1 en functies toestemming en lokalisatie via Mitz. Het moment van ingebruikname van Mitz verschilt tussen de oplossingen van Founda en Enovation, en de oplossing van Alpatron. Gebruikers van de oplossing van Alpatron dienen bij ingebruikname al aangesloten te zijn op Mitz, omdat in de oplossing van Alpatron de functie toestemming patiënt en de lokalisatiefunctie van Mitz noodzakelijk is voor het onderling uitwisselen van (radiologische) beeldonderzoeken. Gebruikers van oplossingen van Founda en Enovation hebben Mitz niet nodig voor onderlinge uitwisseling. De aansluiting op Mitz voor deze gebruikersgroep is voor DUO wel noodzakelijk.

Zorginstellingen dienen bij ingebruikname van de landelijke oplossing voor beeldbeschikbaarheid met DUO te voldoen aan drie belangrijke randvoorwaarden:


1. *Overeenkomsten getekend en vertrouwen geborgd:* elke zorginstelling kiest zijn voorkeursoplossing. Dat kan een oplossing zijn die al bij de zorginstelling naar tevredenheid in gebruik is. Het is ook mogelijk dat er gekozen wordt voor nieuwe dienstverlening van een nieuwe leverancier, waarmee de zorgaanbieder een overeenkomst sluit. Daarnaast dient elke zorgaanbieder de generieke set van afspraken voor onderling vertrouwen te ondertekenen (Twiin-deelnemersovereenkomst). Deze overeenkomst is toekomstvast en herbruikbaar bij elke mijlpaal en is het resultaat van het lopende initiatief Amsterdam UMC, Erasmus MC met programma Twiin. Deze is gericht op gebruik maken van de mogelijkheden van het Twiin afsprakenstelsel.
2. *Zorginstellingen zijn aangesloten op Mitz:* deze volgt uit de scope van de PoC (zie boven). Inventarisatie van planning bij elke zorginstelling is onderdeel van de vervolgaanpak, in samenwerking met programma Mitz. Daaruit volgt een planning voor de gehele doelgroep.
3. *Voldoende vulling van Mitz:* De raadpleger krijgt via Mitz toegang tot zorginformatie van de bron met toestemming patiënt, als (a) De zorginstelling haar beschikbaar bronmateriaal in Mitz heeft aangemeld, en (b) de patiënt in Mitz toestemming heeft geregistreerd. Gedurende het vervolgtraject ontstaat inzicht in mogelijke knelpunten. In dat geval heeft programma Mitz al eerder aangeboden graag mee te denken met de community om samen ideeën te onderzoeken op impact, haalbaarheid en wenselijkheid.

Aanvullend gelden randvoorwaarden vanuit de projectorganisatie voor het realiseren van de doelstelling:

4. Realiseren van tijdige communicatie voor zorginstellingen “waarin zorginstellingen duidelijkheid krijgen over de uitkomsten van de DUO PoC, financieringsmogelijkheden en daaruit te maken keuzes” (zie besluit 3 adviesrapport).
5. Financiering: hierover zijn afspraken gemaakt door financiers VWS en ZN (zie notitie Opzet financiering, bijlage A adviesrapport)
6. Tijdige beschikbaarheid van ontwikkelcapaciteit bij leveranciers (deels afhankelijk van de financiering).

Op de volgende pagina's staan twee overzichten die inzicht geven op de mijlpalen. Het eerste overzicht geeft inzicht in de activiteiten onder de mijlpalen. Het tweede overzicht toont het perspectief vanuit de groepen zorginstellingen met oplossingen van Enovation, Founda respectievelijk Alpatron. Elk overzicht is voorzien van een legenda. Randvoorwaarden 4, 5 en 6 staan apart benoemd vanuit stroom “Project”.

STREEFDATUMS TECHNISCHE REALISATIE LANDELIJKE BEELDBESCHIKBAARHEID

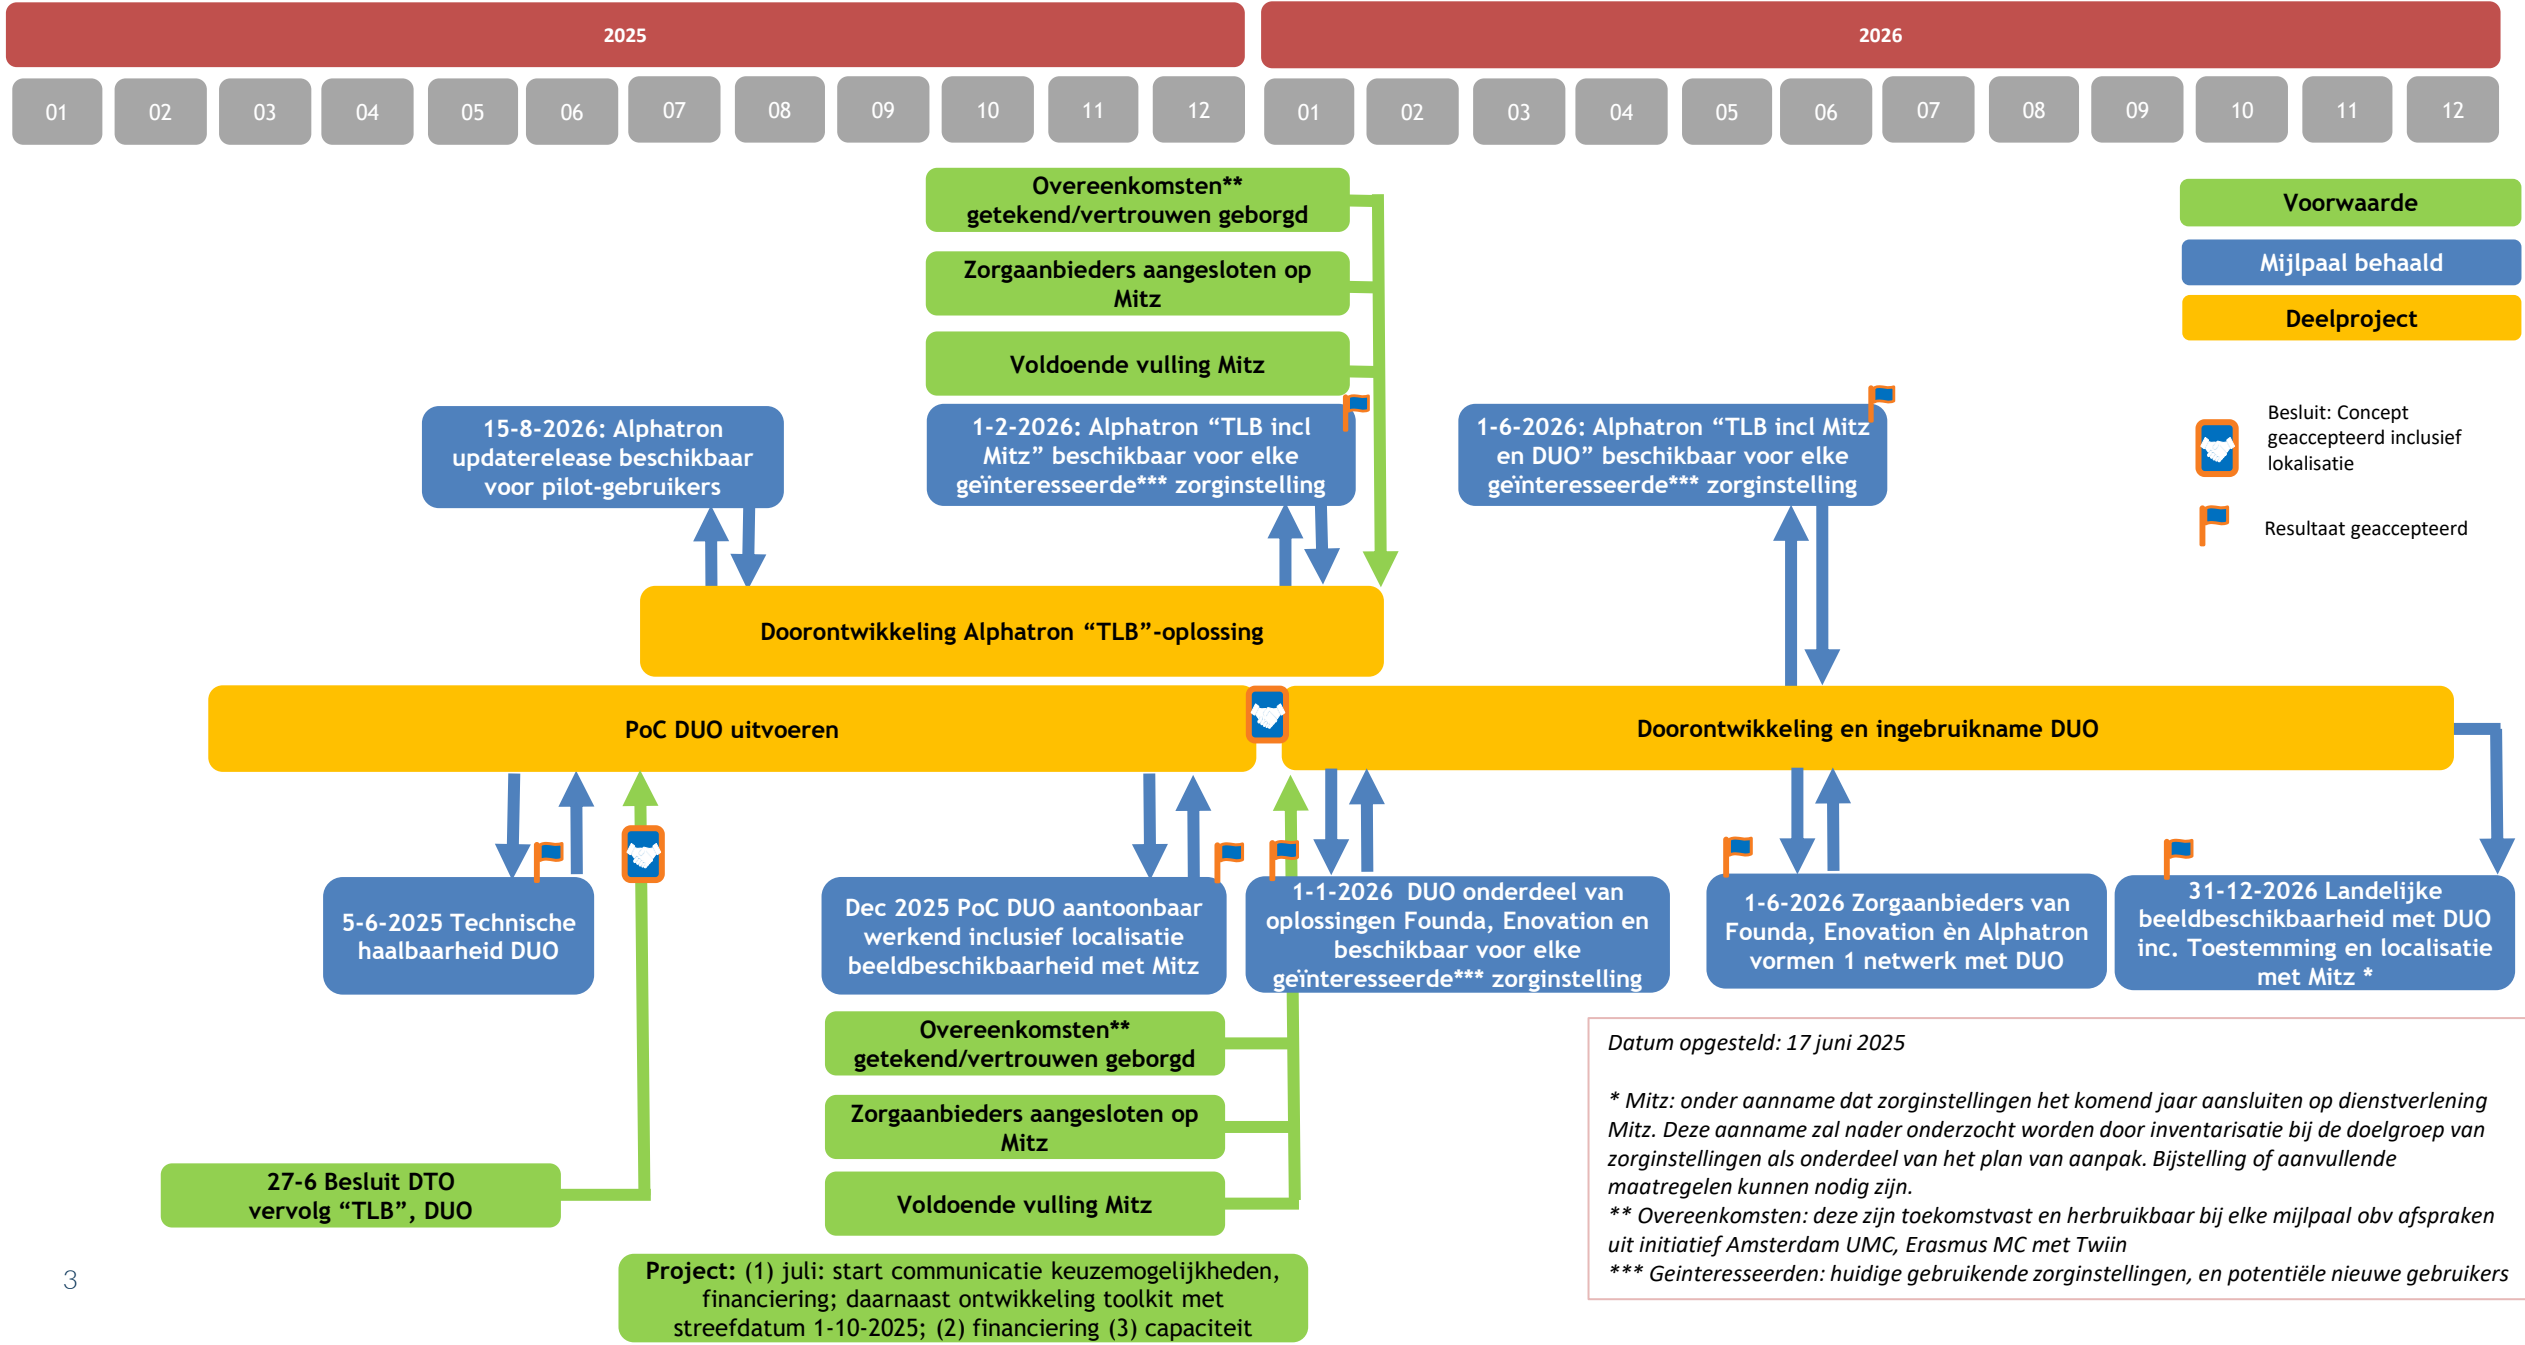

IMPLEMENTATIE LANDELIJKE BEELDBESCHIKBAARHEID ADHV STREEFDATUMS TECHNIEK

